PORTFOLIOCASE · FICTIEVE ORGANISATIE

Van SAP naar Business Central bij een voedingsproducent

Een ERP-migratie geleid vanuit de klant: partnerkeuze, fit-gap, datamigratie, go/no-go en uitrol.

Philippe Godfroy · Onafhankelijke portfoliocase over een fictieve organisatie (Vaerdal Foods). Alle cijfers zijn illustratief.

1 · HET PROBLEEM

SAP stopt, de seizoenen niet

- SAP ECC verliest zijn standaardonderhoud; de enige SAP-ontwikkelaar stopt.
- Planning in Excel, traceerbaarheid op papier, vrijgave per mail.
- Soep van oktober tot februari, BBQ-sauzen vanaf april: er is geen rustig moment.

Medewerkers	Recall-oefening vandaag	Budget
185	**220 min**	**€865.950**

2 · HOE IK BEGON


Niet met software, met de partner en het proces

- Criteria en gewichten vastgelegd vóór de offertes; prijs weegt 15%.
- Elke partner dezelfde demo op ons script, tot en met een recall.
- Zes workshops, telkens vertrekkend van een echt document van vorige week.

Partner A	Partner B	Prijs moet wegen boven
3,75	3,55	40%

3 · WAT IK ONTWIERP

Lots en vervaldatums als ruggengraat

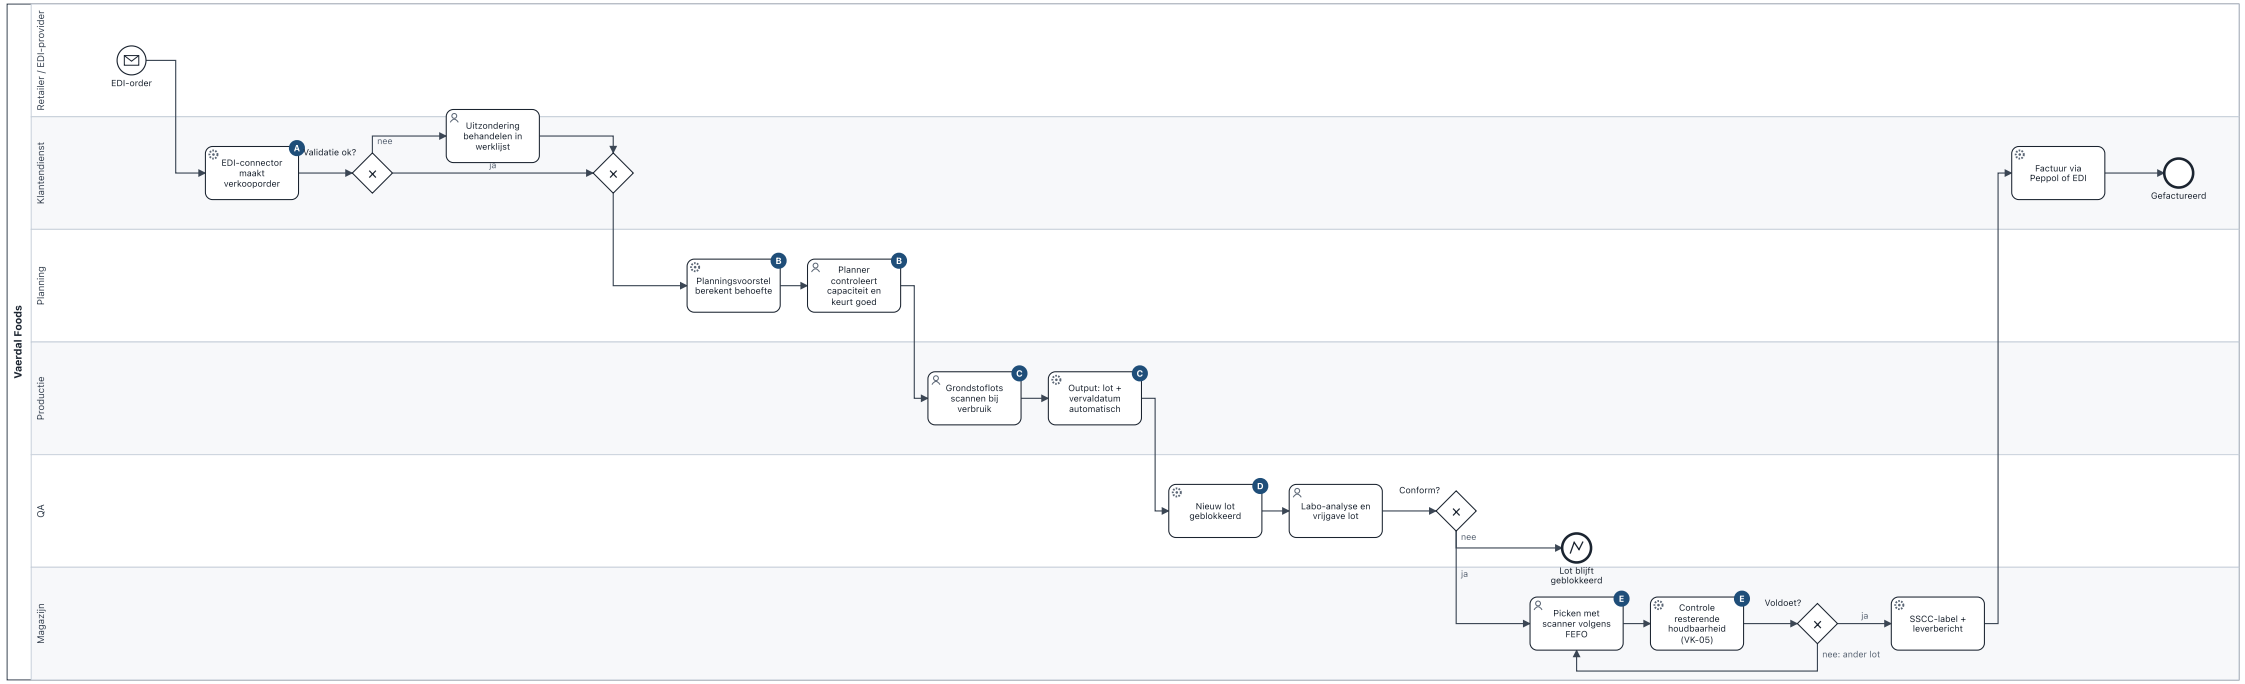

Nieuw lot geblokkeerd tot QA vrijgeeft · FEFO-picking · controle op resterende houdbaarheid per retailer · lotnummers ongewijzigd uit SAP

4 · STANDAARD EERST

Van 146 maatwerkobjecten naar 2 extensies

Eisen	Standaard of configuratie	Extensies	Afgewezen CR's
41	74%	2	€48.700

- Elke eis: klasse, oplossing, dagen, beslisser bij het bedrijf, UAT-scenario.
- Extensies gaan altijd naar de stuurgroep: houdbaarheid per klant en allergenen, beide verplicht.

5 · DE DATAMIGRATIE

Zelfde aantal fouten, andere lots

- 15 kwaliteitsregels, elk met een eigenaar in de business; vier proefmigraties.
- Generale repetitie: 107 lots halffabricaat zonder vervaldatum, allemaal nieuw.
- Oorzaak: een eigen SAP-transactie. Opschonen zonder de bron te herstellen is dweilen met de kraan open.

Mock recall	Blokkerende fouten	Voorraadverschil
96,7%	107	2,131%

6 · DE BESLISSING

No-go op 1 maart, go op 1 april

- Criteria vastgelegd in week 16; een hard criterium wordt niet kwijtgescholden.
- Vier opties met kost en risico op één pagina; advies: vier weken uitstel.
- De stuurgroep besliste. Kost €55.700 uit de reserve, €23.550 bleef over.

Go/no-go 1 · W25

NO-GO

Go/no-go 2 · W29

GO

Recall na herstel

100,0%

7 · WAT DIT ZEGT OVER MIJ

Ik bescherm de go-live, niet de datum

- Ik werk vanuit de business: proceseigenaars beslissen, key users testen hun eigen werk.
- Ik stuur een partner met afspraken die op voorhand vastliggen: acceptatie, change, reserve.
- Ik maak slecht nieuws concreet: welke oorzaak, welke opties, wat het kost.

Case, control room met rondleiding, code en geautomatiseerde testen: phlppgdfry.github.io/manufacturing-erp-migration-programme · niets draait in een echte Business Central-omgeving; resultaten zijn gesimuleerd.
